IN THIS REPORT: run[0003; Brandon Hospital Clean Utilities, [YES], This run is for the Clean Utilities only so that we can clear the Plumbers! Line#1078,Part#107108,Elv# 53] run_layup[0032; [0001; 11/16" Particle Board HPL/CL], [1882; WA 7205 Bengal Teak], [1723; WA 1570 White]] grid[0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032,

21; 1 49.0 x 97.0 sheet of 11/16" Particle Board HPL/CL - WA 7205 Bengal Teak - WA 1570 White

Legacy Grid# 7

Part#	Description	Cut X	Cut L	Edge X1	Edge L1	Edge X2	Edge L2	Qty
389	DRAWER FRONT, TOP SGL	17.79140	5.75000	3mm Black	3mm Black	3mm Black	3mm Black	1
363	HL WALL DOOR, DBL	15.33320	29.43750	3mm Black	3mm Black	3mm Black	3mm Black	3
367	HR WALL DOOR	23.04140	29.43750	3mm Black	3mm Black	3mm Black	3mm Black	2
376	HR WALL DOOR, DBL	15.95820	17.43750	3mm Black	3mm Black	3mm Black	3mm Black	5

Yield: 91.51% Type: long rip Cycles: 1, 1 sheet per cycle

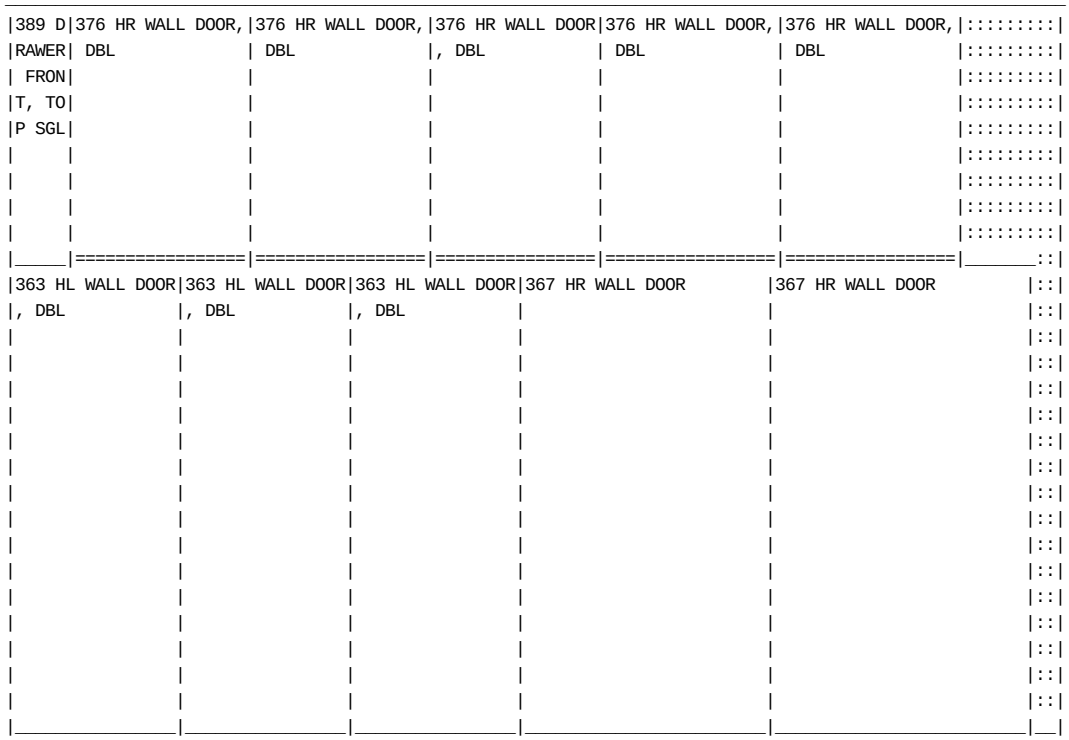

CUT INSTRUCTIONS FOR 48.0000 X 96.0000 ities

RIP # 1. 17.7914 with crosscuts at: 5.7500 (15.9582, 15.9582, 15.9582 15.9582, 15.9582: re-rip to 17.4375)

RIP # 2. 29.4375 with crosscuts at: 15.3332, 15.3332, 15.3332, 23.0414 23.0414
